Утверждаю:
Директор подрядчика/исполнителя
_____Ф.И.О.
«_____»_____20___г

Согласовано:
Директор (наименование подразделения-заказчика)
_____Ф.И.О.
«_____»_____20___г

График производства работ по договору № …..
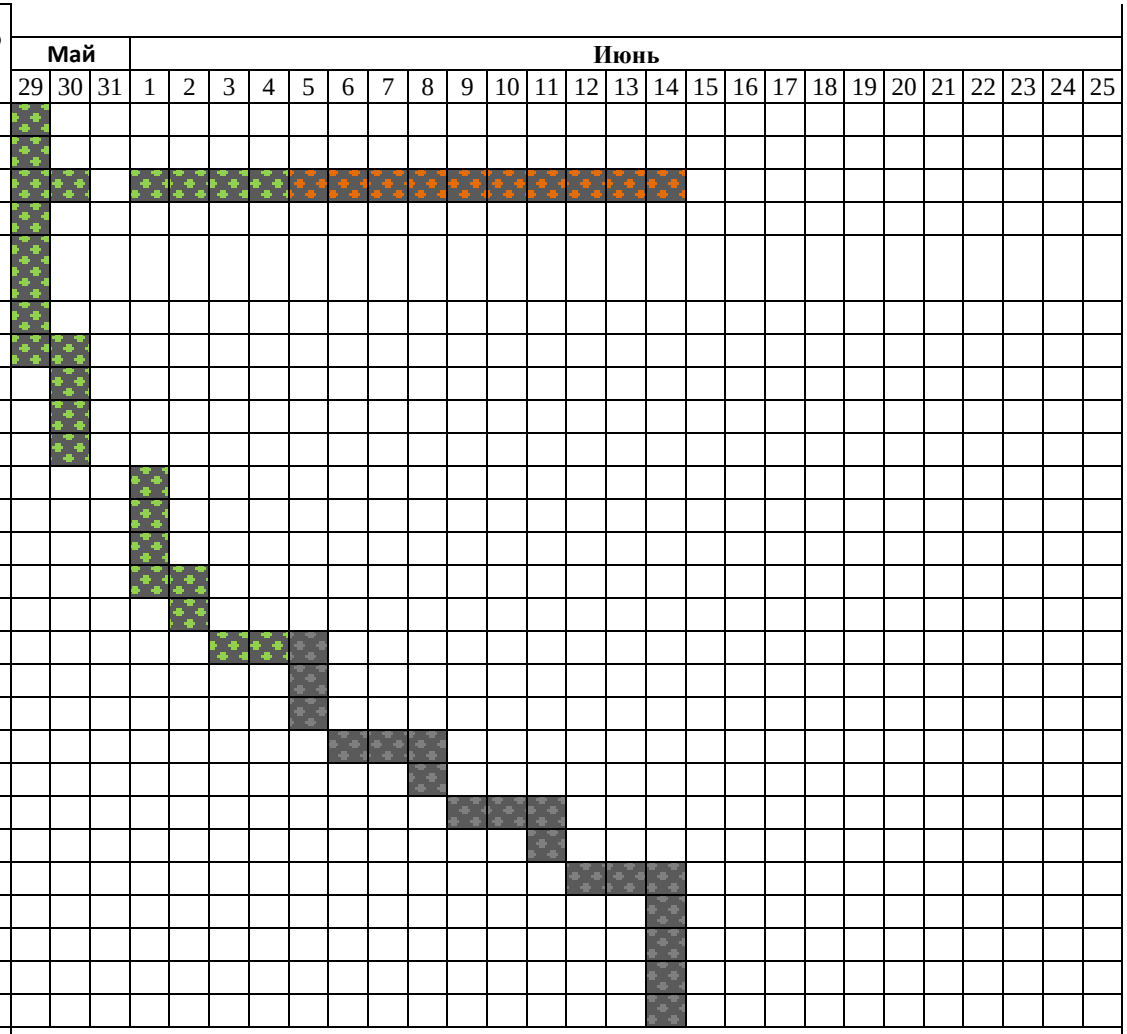
№ п.п.	Наименование работ	Длительность, часов	Кол-во	Стоимость
1	Подача списков персонала на пропуск	**1**		
2	Организация допуска персонала	**0,5**		
3	**Восстановление АКБ Varta 48В-500 А×ч**	**396**		
3.1	Вывод АКБ из эксплуатации	0,5		
3.2	Восстановление контактной поверхности полюсных выводов, замена перемычек	2,0		
3.3	Подготовка групп	0,5		
3.4	КТЦ №1 элементов №1-24	48		
3.5	Диагностика (проверка плотности)	0,5		
3.6	Сборка АКБ	0,5		
3.7	Ввод АКБ в эксплуатацию на два дня	0,5		
3.8	Вывод АКБ из эксплуатации	0,5		
3.9	Подготовительные работы	0,5		
3.10	Подготовка групп	0,5		
3.11	КТЦ №2 элементов №1-24	48		
3.12	Диагностика (проверка плотности)	0,5		
3.13	КТЦ №3 элементов №5-11,13-18	72		
3.14	Диагностика (проверка плотности)	0,5		
3.15	Принятие промежуточного решения №1	0,5		
3.16	КТЦ №4 элементов №5-11,13-18	72		
3.17	Диагностика (проверка плотности)	0,5		
3.18	КТЦ №5 элементов №13-18	72		
3.19	Диагностика (проверка плотности)	0,5		
3.20	КТЦ №6 элементов №1-24	72		
3.21	Диагностика полная	1,0		
3.22	Сборка АКБ	0,5		
3.23	Ввод АКБ в эксплуатацию	0,5		
4	Оформление актов приемки	1		
Продолжительность восстановления в часах		**384**		
	Итого:			
	Подпись представителя заказчика			
	Подпись представителя подрядчика
